Prospetto del Muro costruito lungo la Strada Lizza di Gioja verso Colonnata

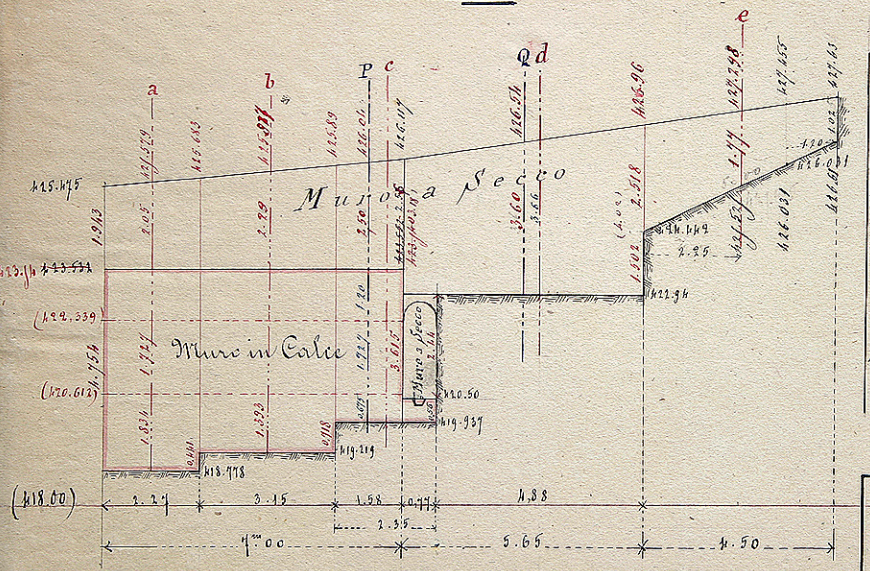

Muratura

In Calce			A Secco		
2.27 X 1.80 X 1.83 M.C.	7	48	7.00 X 1.20 X 1.94 + 2.56 / 2	18	90
3.15 X 1.80 X 1.39 "	7	88	0.77 X 2.44 X 1.20 =	2	25
1.58 X 1.80 X 0.67 "	1	90	5.65 X 3.18 + 4.02 / 2 X 1.20 "	24	40
0.77 X 1.80 X 0.56 "	0	78	4.50 X 2.58 + 1.02 / 2 X 1.20 = "	9	55
7.00 X 1.50 X 1.72 "	18	06	Totale M.C.	55	10
7.00 X 1.20 X 1.20 "	10	08			
Totale M.C.	46	18			

Scavi di Fondazione

N.° 5

a	2.27 X 2.40 X 2.55 = M.C.	13	89
b	3.15 X 2.02 X 2.86 = "	18	20
c	2.35 X 2.11 X 3.08 = "	15	27
d	5.65 X 1.53 X 1.37 = "	11	84
e	4.50 X 1.30 X 0.30 = "	1	75
	Totale M.C.	60	95
